

Projektrapport Bröstcentrum

Rapport till: KLRI, BSF

Mötesdatum: KLRI 250129, BSF 250212

Upprättad av: Mikael Thylander

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2025-01-14	
Ekonomi	2025-01-14	
Tidplan	2025-01-14	
Bilagor	2025-01-14	

Förord/Ingress

Grunden för projektet är en donation från Julia och Hans Rausings stiftelse, riktad till SUS, för att stärka vården inom bröstcancer. Denna donation har under 2022 och 2023 diskuterats med stiftelsen, SUS och Regionfastigheter Fastighetsutveckling, och resulterat i en omfattning som består av två delar:

1. Ny MR Linac – strålbehandling med magnetröntgen. Ska monteras i befintlig strålningsbunker i Lund, och projektleds av Verksamhetsområde Basprojekt i Lund.
2. Nytt bröstcentrum i Malmö i ny byggnad om ca 3500 kvadratmeter [5000] kvadratmeter. Samlokalisering av flera verksamheter på Malmö sjukhusområde i syfte att ge en bättre samlad vård och förenkla ”vårdresan” för patienten. I den nya byggnaden ska patienten få utredning, konsultation och behandling.

Regionstyrelsen beslutade om projektet i oktober 2023.

Första operativa styrgruppsmötet hölls den 16 januari 2024.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Målet är att [Bröstcentrum] byggnaden skall vara klar för inflyttning av verksamheten under 2027. Framtagen tidplan ger en projektöverlämning i slutet av 2028.

Behovsanalysen för Bröstcentrum är färdigställd.

Tidplanen för MR Linac har reviderats baserat på leveranstiden och installationstiden för utrustningen.

1.2 Kvalité

Inget att rapportera.

1.3 Ekonomi

-

1.4 Övrig status att informera

Förslag till nyttjande av resterande bygg rätt är framtagen av verksamheten och en första version av behovsanalys för onkologisk öppenvård finns nu.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Projektet fick i uppdrag att arbeta vidare med gemensam förstudie för Bröstcentrum och onkologisk öppenvård. Fortsatt arbete med att beskriva driftkostnadsprognoser och effekthemtagningar ska göras i behovsanalyserna.


2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Bröstcentrum	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i mkr</i>			dec-24	dec-24	nov-24
Byggnadsinvestering	354	20	3	354	354
Utrustningsinvestering	122	87	0	122	122
SUMMA	476	107	3	476	476
<i>Donationsmedel och riskmedel ingår i planeringsmedel/medels tilldelat</i>					
<i>Övrigt kommentar</i>					
Se vidare i bifogad ekonomibilaga.					

3 Tidplan

3.1 MR Linac Lund

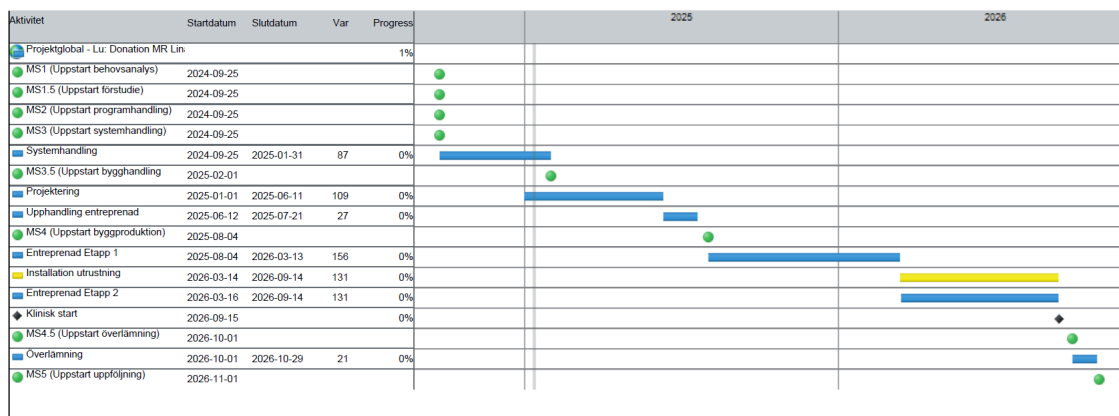

*Uppdaterade tidplan daterad 2025-01-14.

**Projektet har fått besked avseende leverans för Linac till 1 september 2026 och projektets tidplan har anpassats efter detta.

3.2 Bröstcentrum Malmö



*Tidplanen förutsätter beslut avseende etapp 2 för samordnad programhandling och projektering

4 Bilagor

Inga
