

Projektrapport BSH

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230925, BSF 231013

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-09-07	
Ekonomi	2023-09-07	
Tidplan	2023-09-07	
Bilagor	2023-09-07	Ekonomibilaga

Förord

Våren 2021 togs beslut av Regionstyrelsen att etablera ett nytt sjukhusområde i Helsingborg i stället för att fortsätta ombyggnaden av befintligt sjukhus (NSH). Målbilden är att ett nytt sjukhus kan vara på plats 2033.

Fram tills att Helsingborgs lasarett kan flytta till nya lokaler skall det bedrivas fungerande akutsjukvård på befintligt sjukhusområde i åtskilliga år framöver. De verksamheter som tidigare varit planerad för ombyggnad/nybyggnad i NSH-projektet har inventerats och de mest prioriterade behoven har identifierats. Verksamheterna har noga övervägt vilka byggåtgärder som är nödvändiga för att fungera enligt gällande lagar, regler och krav. Utöver brister i verksamheternas lokaler finns även fastighetsägarinvesteringar, FÄI, som måste genomföras då NSH-projektet inte fullföljs.

På grund av omfattningen av de samlade investeringarna för byggåtgärderna, samt den komplexitet det innebär att genomföra flera delprojekt samtidigt, samlas projekten i ett strategiskt projekt - BSH (Befintligt Sjukhus Helsingborg).

1 Projektstatus

1.1 Tid

Beslutet att godkänna budgeten för BSH togs i regionfullmäktige den 13 december 2022. Tilldelning av projektmedel beslutades i regionstyrelsen den 23 maj 2023.

BSH planeras att genomföras under 2023 - 2026 enligt plan. En huvudtidplan för BSH har tagits fram. Slutförande av förstudierna för delprojekten färdigställdes i april förutom Barn- och ungdomsakutmottagning som färdigställdes september 2023. Programhandlingsarbete pågår i huvudparten av delprojekten.

1.2 Kvalité

BSH-projektets syfte är att åtgärda de mest prioriterade bristerna i Helsingborgs lasarets lokaler och tekniska system för att vårdverksamhet skall kunna bedrivas en jämförelsevis begränsad tidsperiod.

Avskrivningstiden för investeringarna blir därmed mycket kort. Delprojekten varierar i omfattning där vissa endast innefattar ytskiktsrenoveringar. Det finns risk att avvikelser kommer krävas som hanteras enligt fastlagda rutiner.

1.3 Ekonomi

Beslutad budget för BSH är totalt på 845 miljoner kronor fördelat på bygginvestering 643 miljoner kronor varav fastighetsägarinvesteringar ingår med 122 miljoner kronor samt 82 miljoner kronor för utrustningsinvestering. Ingen förväntad prognosändring från budget i dagsläget.

1.4 Övrig status att informera

1.5 Information från Operativ Styrgrupp


2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Befintligt Sjukhus Helsingborg (BSH)	Planerings utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			aug-23	aug-23	mar-23
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>					
Byggnadsinvestering	763	763	8	763	763
Utrustningsinvestering	82	82	0	82	82
SUMMA	845	845	8	845	845
<i>Riskmedel ingår i medelstilldelat</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

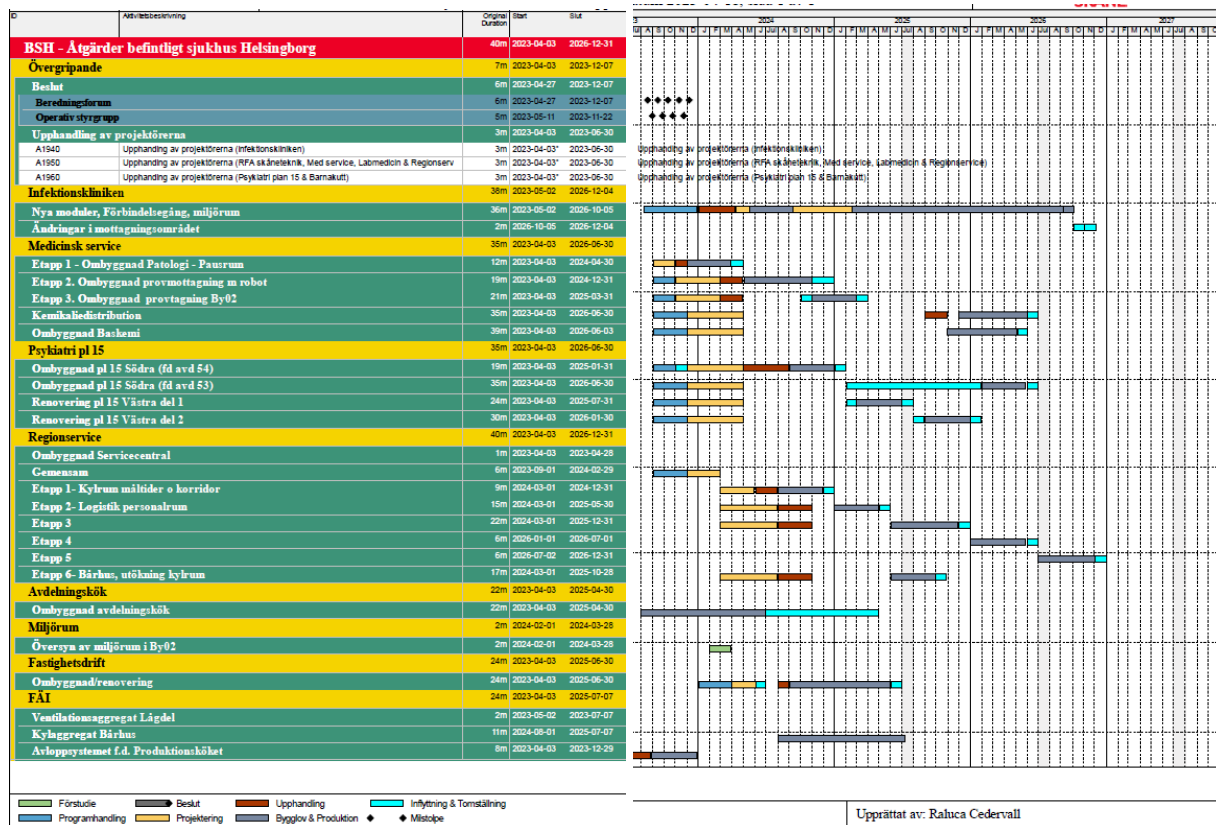

4 Bilagor

Ekonomibilaga
