

Projektrapport Akutmottagningar i Kristianstad och Ystad

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230925, BSF 231013

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-09-05	
Ekonomi	2023-09-05	
Tidplan	2023-09-05	
Bilagor		

Förord/Ingress

Beslut i Regionstyrelsen 2022-05-22:

1. Regionstyrelsen ger beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för en upprustning av akutmottagningarna i Ystad respektive Kristianstad.
2. Regionstyrelsen godkänner investering om 5 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor i Kristianstad och 2 miljoner kronor i Ystad, för de tidiga skedena vilket finansieras ur regionstyrelsens ram för oförutsett 2022.

Detta uppdrag har genomförts i form av förstudier på respektive ort.

Ur protokoll 2023-04-24, Beredningen för strategisk fastighetsutveckling:

Förstudier kring akutmottagningarna i Ystad och Kristianstad har nu färdigställts. Det finns behov av kompletterande åtgärder som ska avrapporteras inför budgetprocessen hösten 2023.

Beredningen för strategisk fastighetsutveckling föreslår fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen följande:

1. Beredningen för strategisk fastighetsutveckling ger fastighetsdirektören i uppdrag att komplettera förstudien med ett alternativ placeringsförslag av akutmottagningen på Ystad lasarett.
2. Beredningen för strategisk fastighetsutveckling ger fastighetsdirektören i uppdrag att säkerställa att förstudien för akutmottagningen i Kristianstad stämmer överens mot framtida utvecklingsplaner för sjukhusområdet.

1 Projektstatus

1.1 Tid

1.1.1 Kristianstad

Arbetet följer tidplanen.

1.1.2 Ystad

Arbetet följer tidplanen.

1.2 Kvalité



1.2.1 Kristianstad

Någon form av nybyggnation för tekniktung vård – i anslutning till huvudbyggnaden – är ett troligt inslag i en framtida utveckling av sjukhusområdet i Kristianstad. Verksamheten på CSK har därför listat verksamheter som vore lämpliga att placera i en sådan byggnad.

Verksamhet	Rumsfunktion	antal	kommentar
OP	Op-sal	18-20	Befintliga OP-salar belastas idag av dagkirurgi. Flyttar man ut COP i en ny byggnad och behåller de gamla för dagkirurgi så kan antalet diskuteras.
	Post-OP		Trenden går åt att fler och fler måste ligga kvar efter operation och att de inte behöver belasta vårdavdelningar
IVA	Vårdplats IVA	10-12	Blandning av enkel och dubbelsalar samt lokal för möjlighet till Kohort-vård.
Neonatal	Vårdplats neo	?	T ex samvård/familjerum
Förlossning	Förlossningsrum	7	
	Samvårdsrum	3	
	Prenatal	6	
	BB-platser	14	
Röntgen	CT	8	
	MR	4	
	Skelettlab	4	
	Angiolab/ intervention	3	
	Genomlysning	1	
Övrigt	Sterilcentral		
	Robot	2	Inom i ovan nämnda 18-20 OP-salar
	Infektion/smita		
	Personalrum		
	Akutrum vid amb.sluss		
	Helikopterplatta		På taket
	Patienthotell		
	Vård under mark i kris		
	Anhörigcenter		I anslutningsbrygga från huvudbyggnad
	Visningsrum		
	Obecitas		Anpassning av utrustning

Med detta som underlag har det tagits fram skisser som prövar möjligheterna att ansluta en byggnad för tekniktung vård till tillbyggnaden för akutmottagningen som föreslogs i förstudien. Skisserna bearbetas i samarbete med verksamheten.

Det har även förts en dialog med Kristianstads kommun angående Kristianstadlänkens (en bussgata genom området) sträckning, som är avgörande för möjligheterna att i markplan koppla samman byggnader i detta läge.

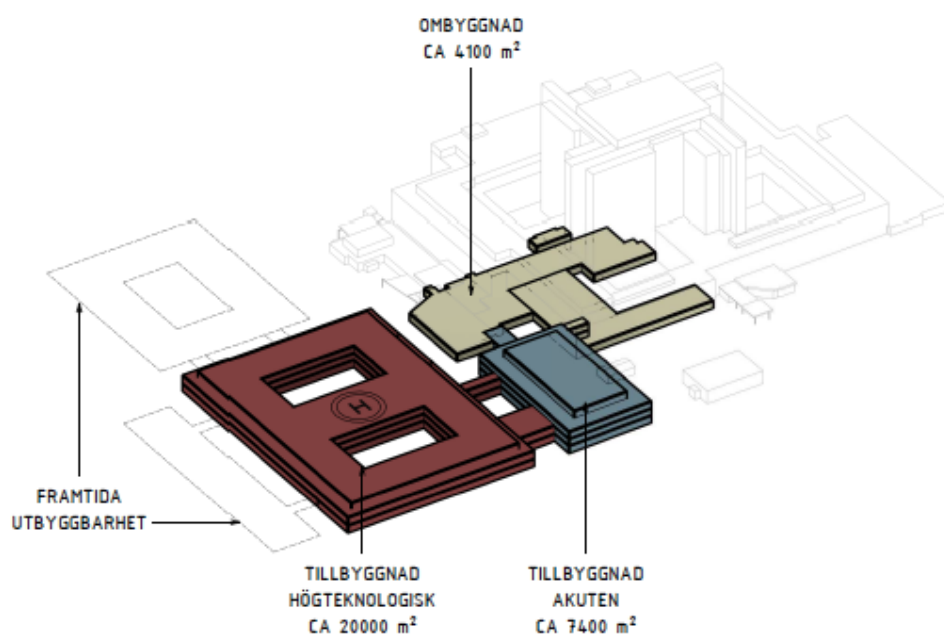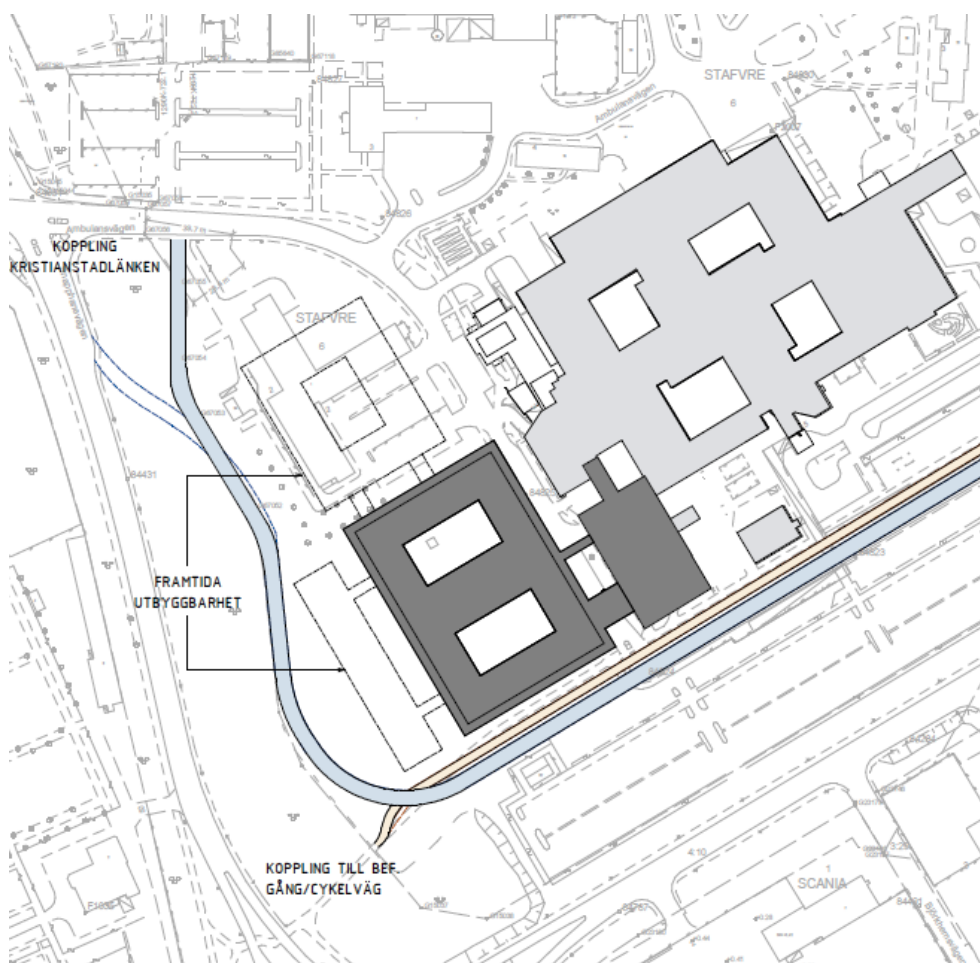

Skiss 23-08-28, situationsplan och volymsskiss

1.2.2 Ystad

Uppdraget ska pröva en alternativ placering av akutmottagningen, mot bakgrund av de möjligheter att utveckla sjukhusområdet som den beslutade avvecklingen av produktionsköket i Ystad kan öppna för.

I samma byggnad som köket (by 13) finns bland annat godsmottagning, personalmatsal, konferensrum och en del teknik. En annan placering av dessa kvarvarande funktioner är en förutsättning för en akutmottagning i detta läge.

Uppdraget utreder därför en inplacering av en ny servicebyggnad på sjukhusområdet, för att möjliggöra en ny vårdbyggnad där by 13 står idag.


Den föreslagna placeringen av servicebyggnaden förutsätter att by 08 (en envånings förskolebyggnad) rivs, och att den administration som finns där idag (ca 20 arbetsplatser) evakueras.




Skiss 23-08-22, situationsplan

Servicebyggnaden antas innehålla:

- Godsmottagning
- Avfallshantering
- Lager för måltider, läkemedel, vätskor
- Personalmatsal, konferensavdelning och administration

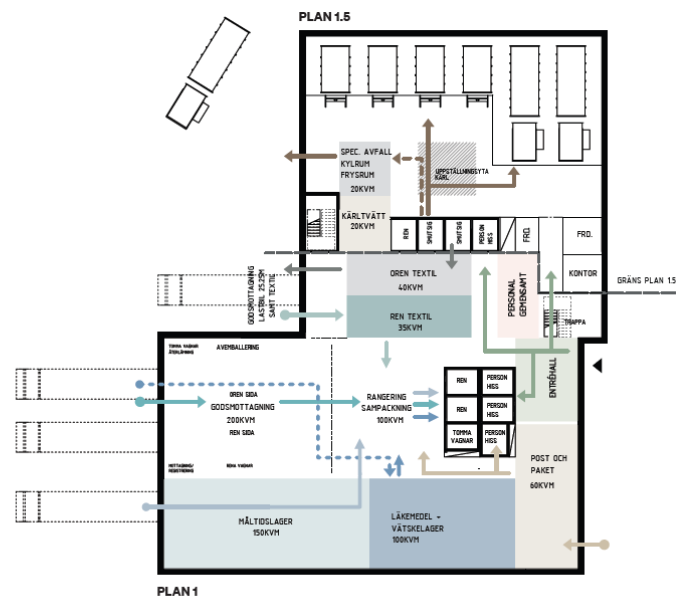


Skiss 23-08-22, servicebyggnad plan 09-10

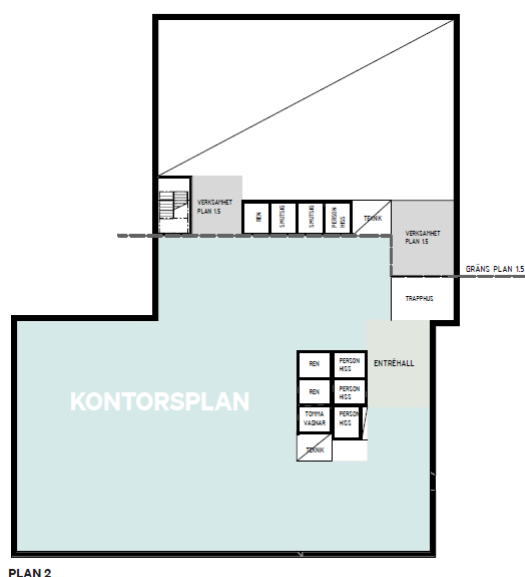


Skiss 23-08-22, servicebyggnad plan 11-12

En akutmottagning ingår i ett kluster av vårdverksamheter med starka inbördes samband. En sambandsbild har upprättats, som ligger till grund för det innehåll som vårdbyggnaden antas omfatta:

- Akutmottagningar (vuxen och barn), ambulanshall, AVA
- Operation och sterilcentral
- IVA
- Förlossning, BB, neonatal
- Barnavdelning
- Administration

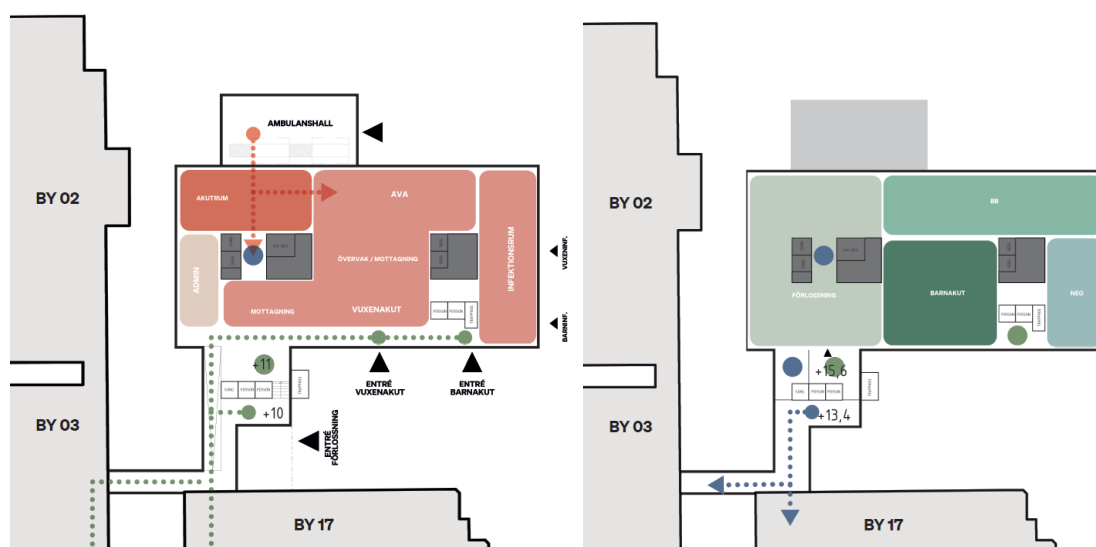

Skiss 23-08-22, vårdbyggnad plan 10-11

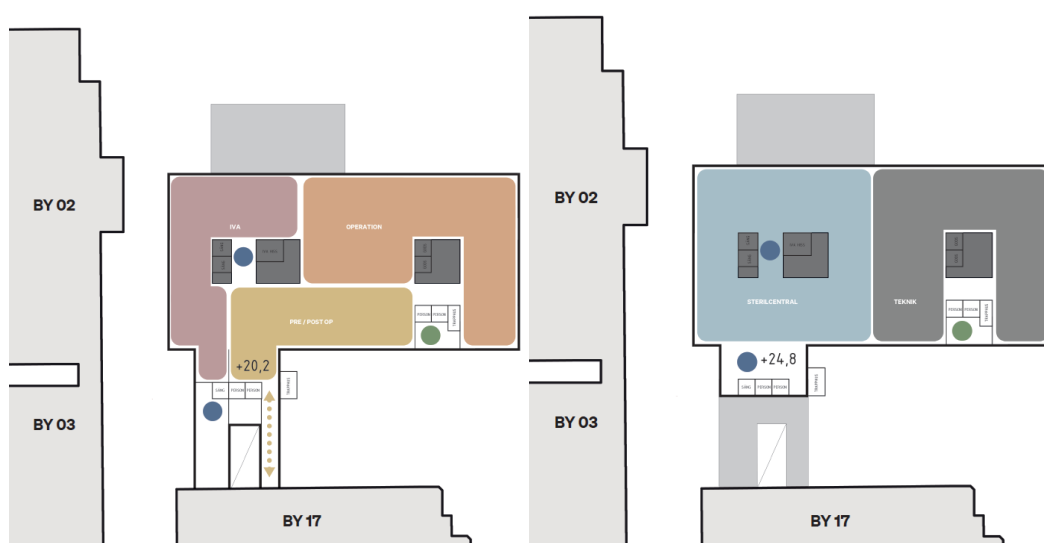

Skiss 23-08-22, vårdbyggnad plan 12-13

En ny vårdbyggnad enligt detta scenario skulle medföra att by 02 kan tomställas. I förlängningen kan by 02 därmed ge plats för ytterligare en vårdbyggnad för exempelvis bilddiagnostik från by 03/04 och vårdavdelningar från by 17.

Att utreda tekniska förutsättningar har inte bedömts möjligt med den tid och den dokumentation som står till buds inom ramen för uppdraget. Därmed kan inte en lämplig kulvertdragning mellan servicebyggnaden och den nya vårdbyggnaden anvisas i detta skede. Det kommer att upprättas en lista på teknikfrågor att utreda i ett eventuellt fortsatt arbete.

Förslaget är även beroende av en genomförandeplan, som inte heller den kommer att kunna skisseras mer än mycket grovt i detta skede.

1.3 Ekonomi

1.3.1 Kristianstad

Uppdraget genomförs inom ramen för tidigare beslutad budget.

1.3.2 Ystad

Uppdraget genomförs inom ramen för tidigare beslutad budget.

1.4 Övrig status att informera

-

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

Denna punkt fylls i efter styrgrupp och av ansvarig tjänsteman delegerad av ordförande i styrgrupp

2 Ekonomi


Tabell 1. Budget och Prognos

Akutmottagningar i Kristianstad och Ystad	Planerings- utrymme	Medel tilldelat	Ack. Utfall	Prognos	Föregående prognos
			aug -23	aug -23	maj-23
Alla belopp angivna i Mkr					
Kristianstad	3	3	0,254	3	3

Ystad	2	2	0,794	2	2
SUMMA	5	5	1,048	5	5


3 Tidplan

3.1.1 Tidplan Kristianstad

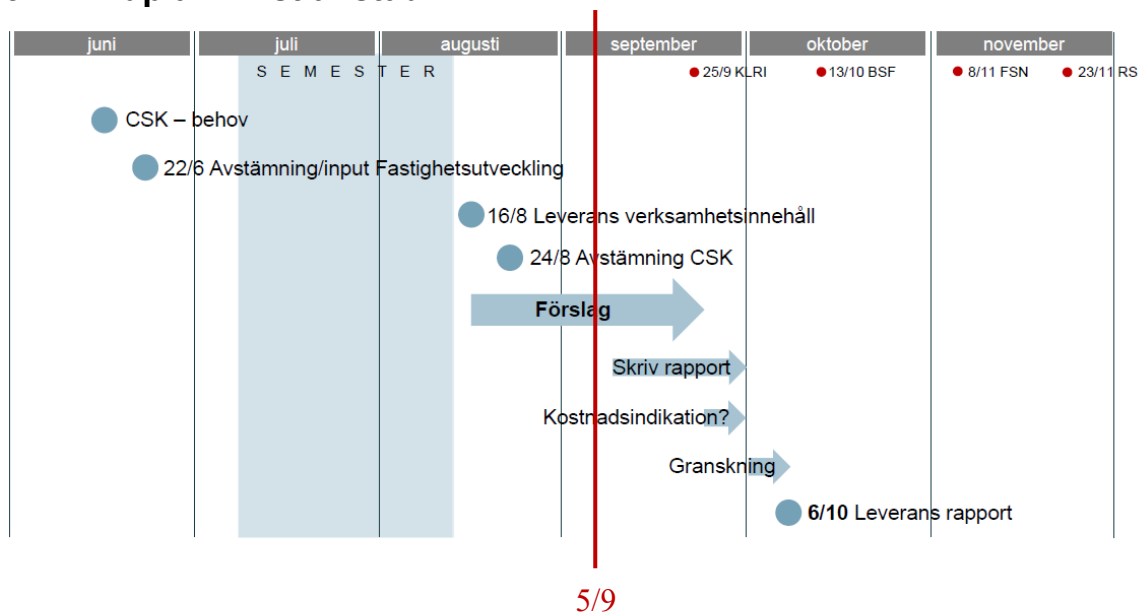

23-06-21

3.1.2 Tidplan Ystad

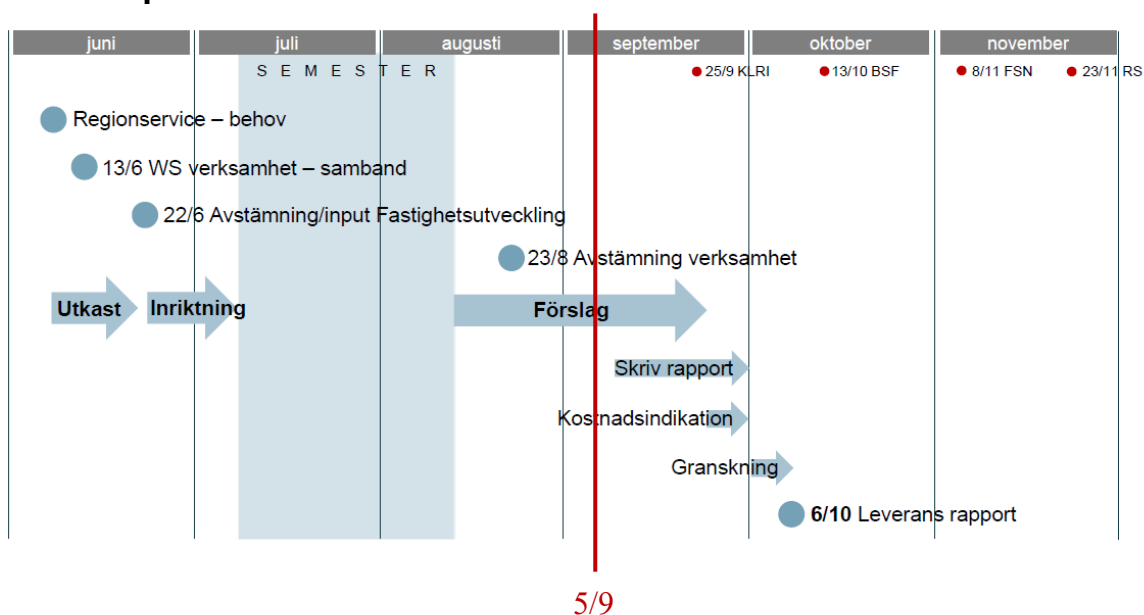

23-06-21
